

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

chezTicket

Plataforma web para venda e inscrição de ingressos em eventos pagos e gratuitos

Período de entregas: 07/09/2026 a 13/12/2026

Modelo de entregas quinzenais (sprints de 2 semanas) — base: Gráfico de Gantt

BACK-END

Java · Arquitetura Hexagonal

FRONT-END

React

BANCO DE DADOS

MariaDB · porta 8080

PAGAMENTOS

Stripe

Apresentação preliminar do cronograma

Visão Geral do Projeto

O que é o chezTicket

- Sistema web (site e aplicativo), similar a sites de Ticket, para publicação e venda de ingressos de eventos — contemplando tanto inscrições gratuitas quanto pagas.
- Repositório do projeto: github.com/chon-lab/chezTicket
- Desenvolvimento estruturado em sprints quinzenais, com entregas incrementais até a apresentação final.

⚠ Observação técnica

A página do projeto no GitHub referencia Vue.js, porém o front-end será desenvolvido em React, conforme decisão técnica da equipe.

Stack Técnica

Back-end **Java**

Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters)

Front-end **React**

Interface web responsiva (SPA)

Banco de Dados **MariaDB**


Instância configurada na porta 8080

Pagamentos **Stripe**

Checkout de eventos pagos e gratuitos

Cronograma de Entregas — Gráfico de Gantt

07/09/2026 a 13/12/2026 · 7 ciclos quinzenais (2 semanas cada)

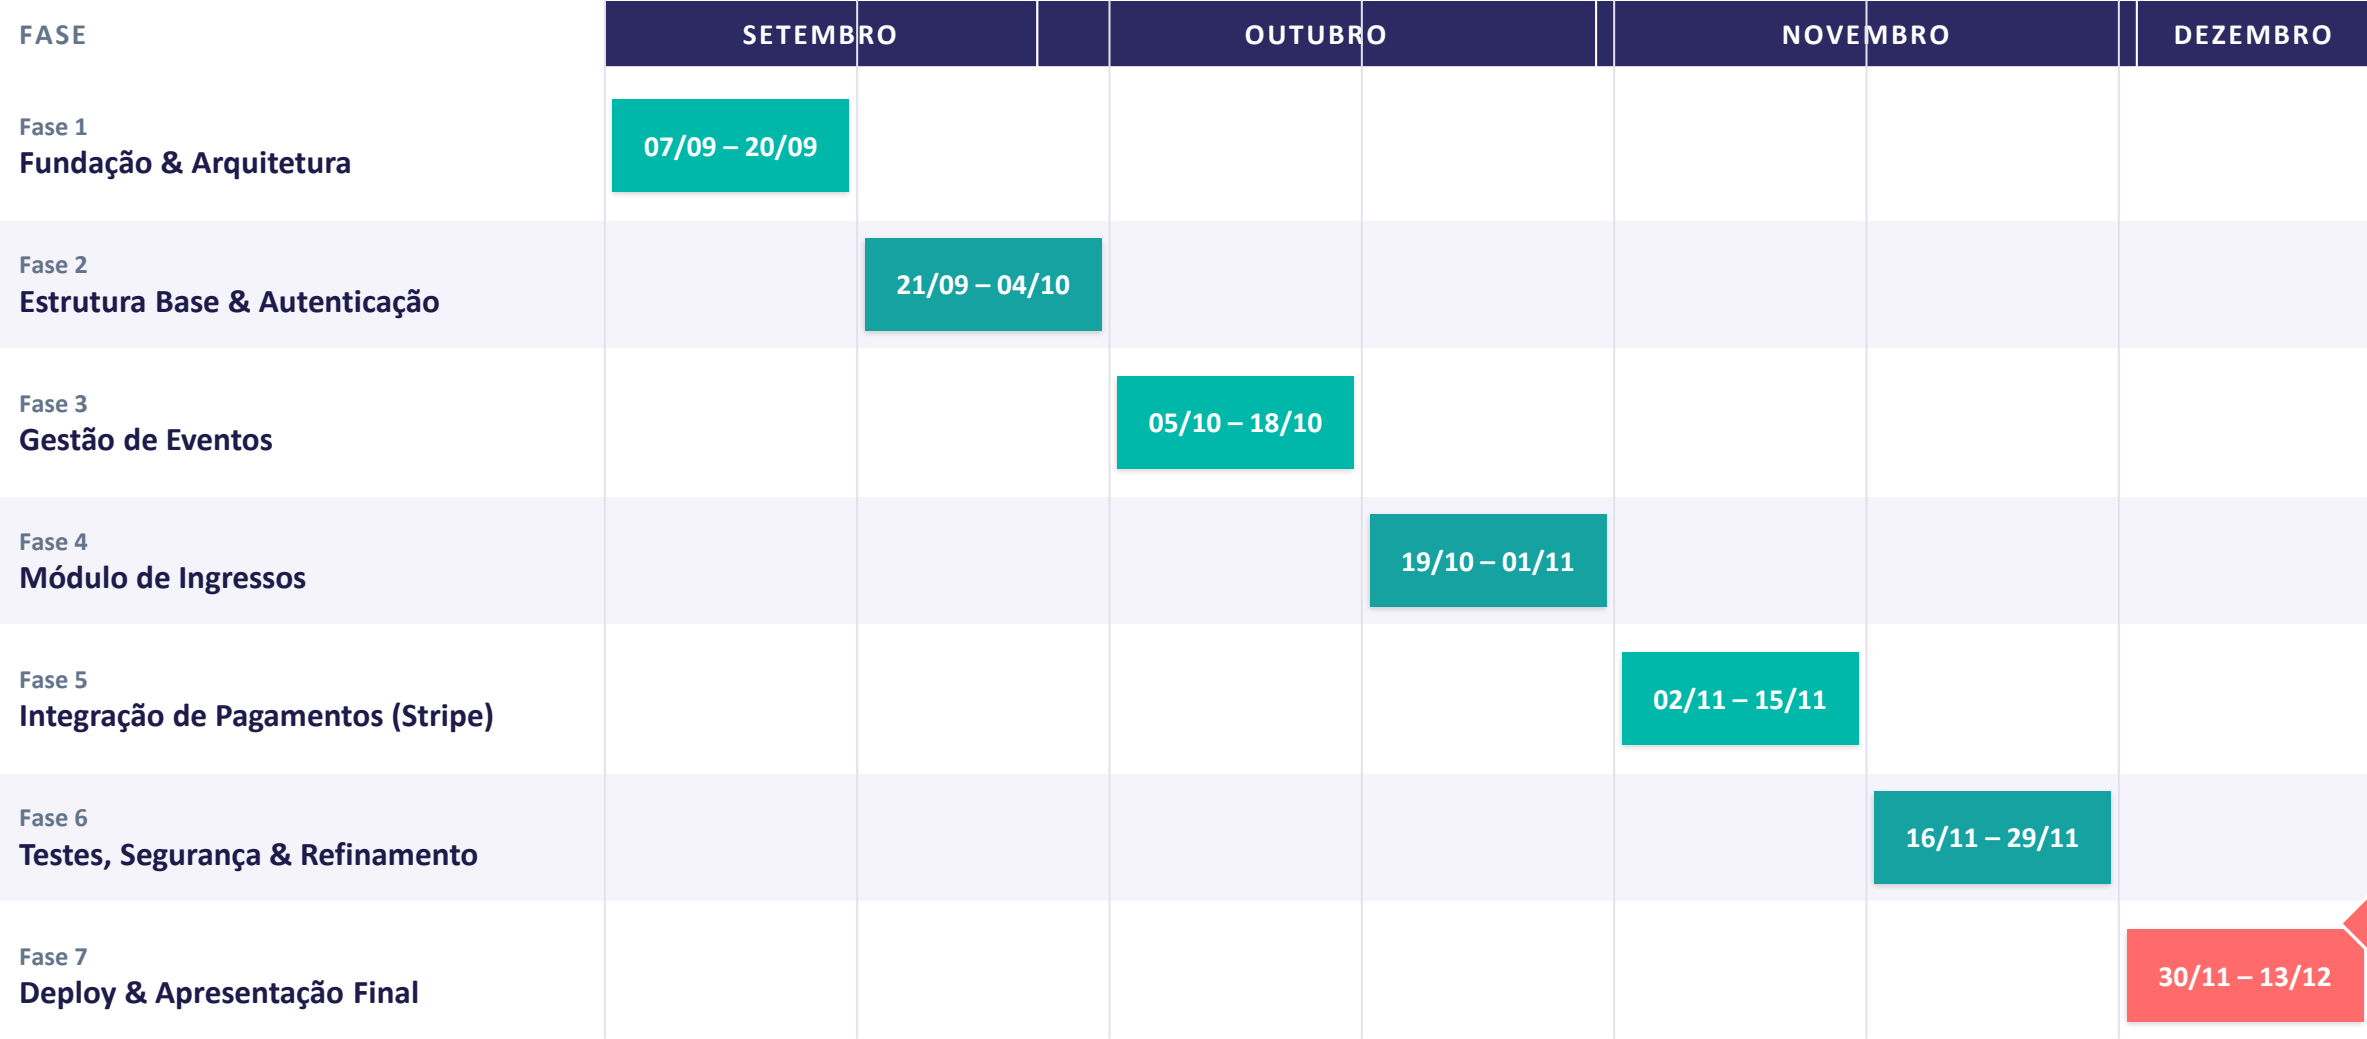

◆ Marco: Apresentação final do projeto (1ª semana de dezembro/2026)

Detalhamento das Entregas por Fase

Principais atividades e entregáveis de cada ciclo quinzenal

FASE	PERÍODO	PRINCIPAIS ENTREGAS
1 Fundação & Arquitetura	07/09 – 20/09	- Levantamento de requisitos e backlog do produto - Modelagem inicial do banco de dados (MariaDB)
2 Estrutura Base & Autenticação	21/09 – 04/10	- Aplicação da estrutura hexagonal (domain / application / adapters) - CRUD de eventons (criar, editar, listar, cancelar) - Entrega da primeira proposta do Figma. - Conexão do back-end com o MariaDB
3 Gestão de Eventos	05/10 – 18/10	- Upload de imagens e categorização de eventos - Busca e filtros de eventos - Testes unitários do módulo de eventos
4 Módulo de Ingressos	19/10 – 01/11	- Tipos de ingresso (gratuito, pago, lotes) - Controle de estoque e disponibilidade - Fluxo de seleção e reserva de ingressos - Tela de checkout no front-end
5 Integração de Pagamentos (Stripe)	02/11 – 15/11	- Integração com Stripe (checkout e webhooks) - Emissão de ingresso/QR Code após confirmação - Tratamento de falhas, estornos e reembolsos - Fluxo de inscrição para eventos gratuitos
6 Testes, Segurança & Refinamento	16/11 – 29/11	- Testes de integração e end-to-end - Revisão de segurança e dados sensíveis (LGPD) - Ajustes de UX/UI - Documentação técnica do sistema
7 Deploy & Apresentação Final	30/11 – 13/12	- Deploy em ambiente de homologação/produção - Testes finais e correção de bugs críticos - Apresentação do projeto (1ª semana de dezembro) - Buffer para ajustes pós-apresentação

Detalhamento das Entregas por Fase

Principais atividades e entregáveis de cada ciclo quinzenal

FASE	PERÍODO	PRINCIPAIS ENTREGAS
1 Fundação & Arquitetura	24/08 – 06/09	- Levantamento de requisitos e backlog do produto - Modelagem inicial do banco de dados (MariaDB)
2 Estrutura Base & Autenticação	07/09 – 20/09	- Aplicação da estrutura hexagonal (domain / application / adapters) - CRUD de eventos (criar, editar, listar, cancelar) - Entrega da primeira proposta do Figma - Conexão do back-end com o MariaDB
3 Gestão de Eventos	21/09 – 04/10	- Upload de imagens e categorização de eventos - Busca e filtros de eventos - Testes unitários do módulo de eventos
4 Módulo de Ingressos	05/10 – 18/10	- Tipos de ingresso (gratuito, pago, lotes) - Tela de checkout no front-end - Entrega da última proposta do Figma
4 Módulo de Ingressos	19/10 – 01/11	- Controle de estoque e disponibilidade - Fluxo de seleção e reserva de ingressos
5 Integração de Pagamentos (Stripe)	02/11 – 15/11	- Integração com Stripe (checkout e webhooks) - Emissão de ingresso/QR Code após confirmação
5 Integração de Pagamentos (Stripe)	16/11 – 29/11	- Tratamento de falhas, estornos e reembolsos - Fluxo de inscrição para eventos gratuitos
